

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

POTOSI - BOLIVIA



1ra RENDICION PUBLICA DE CUENTAS 2018

Prof.: Artemio Mamani Characayo
ALCALDE MUNICIPAL




...!TRABAJANDO POR UNA CIUDAD DE VERDAD DEL NORTE POTOSI!..

La Presente Rendición Pública de Cuentas Contiene toda la información del 1er Semestre de Actividades de la gestión 2018, concerniente a la Administración del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua. En función de una planificación estratégica que nos permitió:

Formular la Programación Operaciones Anual (POA) de la gestión 2018 y la programación presupuestaria.

Determinar los recursos Municipales en función de Objetivos Institucionales, de Objetivos de Gestión, de los objetivos que persigue el desarrollo de nuestro Municipio.



Z
O
N
E
S
D
E
D
E
S
A
R
T
O

De acuerdo a la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, ley N° 482 del 9 de enero del 2014 donde los Gobierno Autónomos Municipales están constituidos por:


a

Concejo Municipal,

b

Órgano Ejecutivo.

El presupuesto Municipal se elaborara bajo los principios de coordinación y sostenibilidad, y está, conformado por el presupuesto del Órgano Ejecutivo y el presupuesto del Concejo Municipal.



M

A

R

C

O

L

E

G


A

L

Artículo 24. (Estructura organizativa) según la ley 482 el órgano ejecutivo estará conformado por:

- a La alcaldesa o el alcalde municipal.
- b Las Secretarías Municipales.
- c Sub Alcaldías.

Artículo 26. Parágrafo 20.- Presentar informes de rendición de cuentas sobre la ejecución del Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto.



TRANSFORMAR LLALLAGUA:

Se está transformando y consolidado en una ciudad intermedia, de oportunidades con infraestructura urbana y rural de vanguardia, con mayores niveles de acceso a:

a **servicios básicos**

b **Mejorar la Educación**

c **Mejorar la Salud**



d **Con avances cualitativos de desarrollo humano.**

GENERAL:

Impulsar el desarrollo Integral, sustentable de Transformación del Municipio de Llalagua Trabajando en la mejora siempre de la Educación, Salud, Servicios básicos, infraestructura, seguridad Ciudadana y otros, tanto en el área Urbana y El Área Rural del Municipio.

ESTRATEGICOS:

- a) Ejecutar El Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto del Órgano Ejecutivo
- b) Optimizar y focalizar la inversión pública municipal en la ejecución de proyectos de infraestructura urbana y Rural
- c) **Priorizar la Transparencia como paradigma**



RECURSOS POA 2018



Recursos

...!TRABAJANDO POR UNA CIUDAD DE VERDAD DEL NORTE POTOSI!..

1.- ASIGNADOS 2018 M.E.F.P. Y REGALIAS

Cuadro N° 1

N°	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Coparticipación Tributaria	31.936.088,00 Bs	18.346.649,00 Bs	-13.589.439,00 Bs
2	Recursos IDH	11.345.718,00	6.505,679,00	-4.840.039,00
3	Recursos Regalías Mineras	620.000,00	204.895,00	-415.105,00
	TOTAL	43.901.806,00 Bs	25.057.223,00 Bs	-18.844.583,00 Bs

2.- RECURSOS PROPIOS 2018

Cuadro N° 2

N°	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Recursos Propios	8.000.000,00 Bs	3.455.623,00 Bs	-4.544.377,00 Bs
2	Recursos de Energía eléctrica	6.500.000,00	3.678.226,00	-2.821.774,00
	TOTAL	14.500.000,00 Bs	7.133.849,00 Bs	-7.366.151,00 Bs.



Fuente: Dirección Financiera

3.- SALDOS 2017

Cuadro N° 3

N°	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Saldos Caja Bancos 2017	20.104.604,00 Bs	20.104.604,00 Bs	0,00
	TOTAL 2	20.104.604,00 Bs	20.104.604,00 Bs	0,00

4.- TRANSFERENCIAS

Cuadro N° 4

N°	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
0	Otras fuentes UPRE GOB.-POTOSI, MIN DE MEDIO AMBIENTE, FDI, UNFPA	10.241.046,00 Bs	10.215.420,00 Bs	-25.626,00
	TOTAL 2	10.241.046,00 Bs	10.215.420,00 Bs	-25.626,00

Fuente: Dirección Financiera



TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS GESTION 2018

Cuadro N° 5

N°	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO
1	Recursos Asignados 2018	43.901.806 Bs	25.057.223 Bs
2	Recursos Propios (Rec. De Energía Electra9.	14.500.000	7.133.849
3	Saldos Caja Bancos 2017	20.104.604	20.104.604
4	Recursos de Contra Parte (Transferidos)	10.241.046	10.215.420
	TOTAL DE RECURSOS	88.747.456 Bs	62.511.096 Bs

TOTAL PROGRAMADO POA 2018

88.747.456,00 Bs

Fuente: Dirección Financiera

1

GASTOS RECURRENTE OBLIGATORIOS POR LEY

2

GASTOS RECURRENTE POR COMPETENCIAS MUNICIPAL

3

GASTOS PARA CONVENIOS

4

GASTOS PARA FUNCIONAMIENTO

5

GASTOS PARA INVERSION (Disponible para Formular)





DESGLOSE DE GASTO POR PARTIDA

a) Programas e Inversión

Cuadro N° 6

N°	DETALLE PARTIDA DE INVERSION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO	%
1	PROM. Y FOMENTO A LA PROD AGROPECUARIA	1.224.302 Bs	427.865 Bs	796.437	35
2	SANEAMIENTO BASICO	1.164.247	252.924	911.323	22
3	CONST. Y MANT. DE MICRORIEGOS	366.557		366.557	0
4	DES. Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	750.000	257.814	492.186	34
5	ASEO URBANO MANEJO Y TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.020.000	487.682	532.318	48
6	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	394.696	148.062	246.634	38
7	INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	6.761.681	2.026.373	4.735.308	30
8	GESTION DE CAMINOS VECINALES	1.413.743	553.990	859.753	39
9	SERVICIO DE CATASTRO URBANO RURAL	207.981	140.960	67.021	68
10	GESTION DE SALUD (2)	14.370.560 Bs.	6.777.093 Bs.	7.593.467 Bs.	47

Fuente: Dirección Financiera

POTOSI - BOLIVIA

Nº	DETALLE PARTIDA DE INVERSION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO	%
11	GESTION DE EDUCACION	16.975.946 Bs.	6.181.938 Bs.	10.794.008	36
12	DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE	8.930.341	1.703.077	7.227.264	19
13	PROM. Y CONSERV. DE CULTURA Y PATRIMONIO	100.000	44.687	55.313	45
14	DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO	100.000	26.857	73.143	27
15	PROM.POLITICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	935.405	111.084	824.321	12
16	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (3)	300.000	135.436	164.564	45
17	SERVICIO DE FAENADO DE GANADO	250.000	109.218	140.782	44
18	GESTION DE RIESGOS	126.956	90.075	36.881	71
19	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	610.557	203.578	406.979	33
20	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	13.967.736	5.626.689	8.341.047	40
21	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	8.792.726	2.219.833	6.572.893	25
TOTAL		78.763.433 Bs.	27.525.235 Bs.	51.238.198 Bs.	35 %

Fuente: Dirección Financiera

ZON

B) GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MPAL.

Cuadro N° 7

N°	DETALLE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO
1	SERVICIOS PERSONALES	992.309 Bs	446.039 Bs	546.270 Bs
2	SERVICIOS NO PERSONALES	45.200	30.957	14.243
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	67.700	23.788	43.912
	SUB TOTAL	1.105.209 Bs	500.785 Bs	604.424 Bs

45%



C) GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

Cuadro N° 8

N°	DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
1	SERVICIOS PERSONALES	7.427.735	3.573.850	3.853.885
2	SERVICIOS NO PERSONALES	378.323	163.981	214.342
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	883.558	333.911	549.647
4	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	3.000	592	2.408
5	OTROS GASTOS	186.197	186.197	0
	SUB TOTAL	8.878.813 Bs	4.258.530 Bs	4.620.283



48%

Fuente: Dirección Financiera

TOTAL DE EJECUCION SOBRE LO PROGRAMADO

Cuadro N° 9

No	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	%
		PROGRAMADO	EJECUTADO		
3	GASTOS DE INVERSION	78.763.433	27.525.235	51.238.198	35
1	GASTO DEL CONCEJO MUNICIPAL	1.105.209	500.785	604.424	45
2	GASTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL	8.878.813	4.258.530	4.620.283	48
	TOTAL	88.747.456	32.284.549	51.238.198	36%



36%

Fuente: Dirección Financiera

ZON




ZONAS

RESUMEN TOTAL PROCESOS DE CONTRATACION

Nº	MODALIDAD	CUANTIA	TIPO DE CONTRATACION	CANTIDAD
1	CONTRATACION MENOR	De Bs1.- (UN 00/100 BOLIVIANO) hasta Bs50.000.-(CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS)	OBRAS	23
			ADQUISICIONES	12
			CONSULTORIAS	19
			SERVICIOS GENER.	7
2	APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE)	Mayor a Bs 50.000.-(00/100 BOLIVIANOS) HASTA Bs.1.000,000 UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS	OBRAS	17
			ADQUISICIONES	11
			CONSULTORIAS	3
			SERVICIOS GENER.	2
3	LICITACION PUBLICA (LP)	Mayor a Bs 1.000.000 (UN MILLON UN 00/100 BOLIVIANOS ADELANTE)	OBRAS	2
			ADQUISICIONES	3
			CONSULTORIAS	0
			SERVICIOS GENER.	0
4	CONTRATACION POR EXCEPCION	SIN LIMITE DE MONTO	OBRAS	03
			ADQUISICIONES	2
			CONSULTORIAS	1
			SERVICIOS GENER.	1
5	CONTRATACION DIRECTA	SIN LIMITE DE MONTO	OBRAS	0
			ADQUISICIONES	4
			CONSULTORIAS	0
			SERVICIOS GENER.	1
TOTAL				111

RESUMEN TOTAL DE EJECUCION


TOTAL	CONCLUIDO	EN EJECUCION	EN LICTACION.	ELABORACION	OBSERVADOS			
169	45	55	25	37	7			
100,00%	26,63%	32,54%	14,79%	21,89%	4,14%			

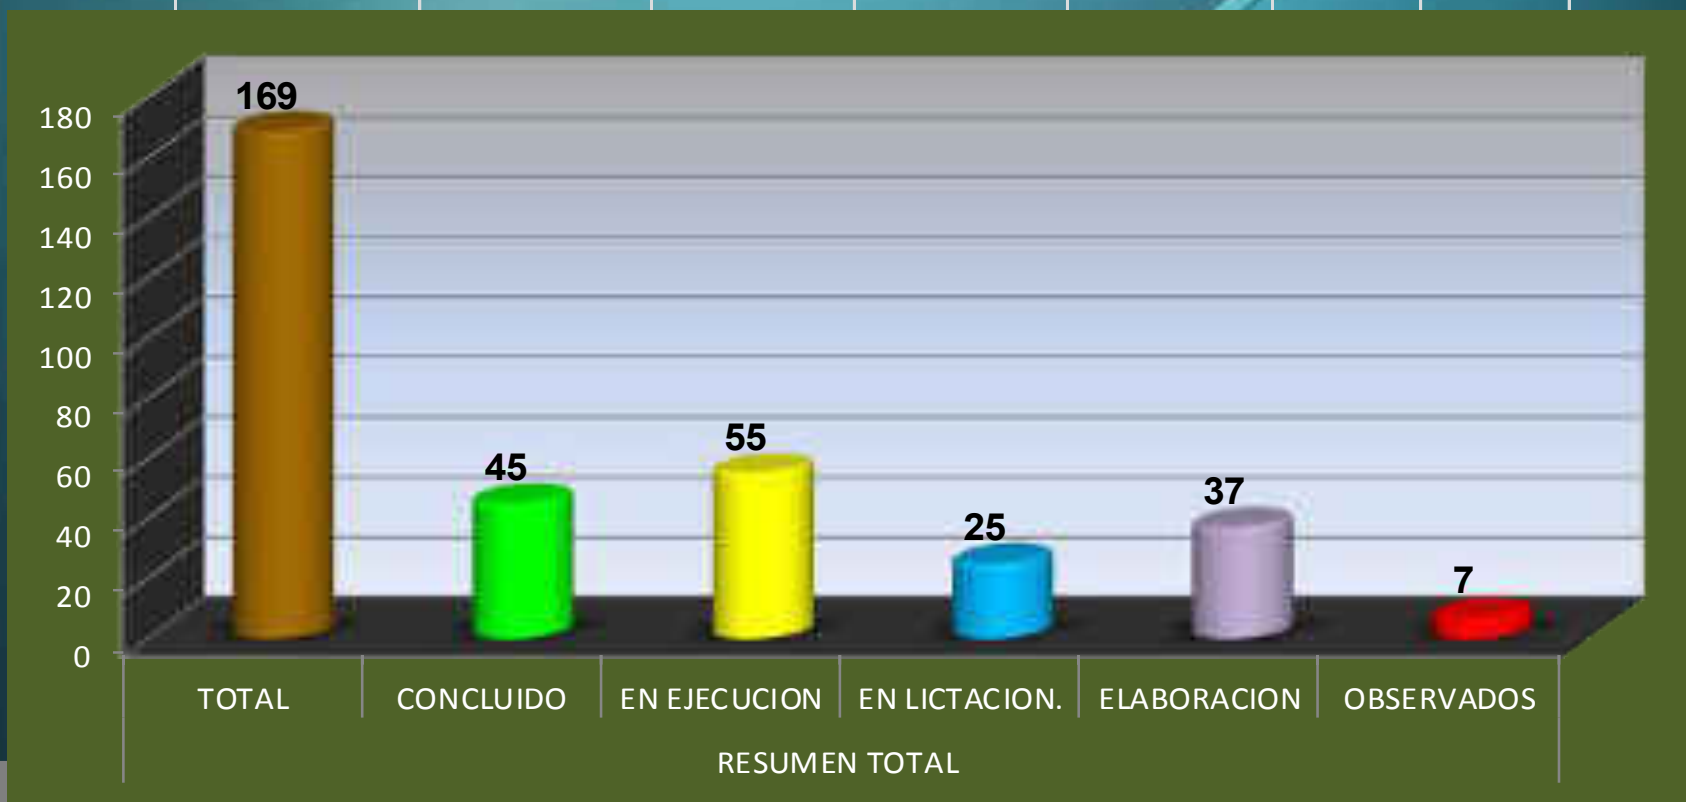

E
J
E
C
U
C
I
O
N

POTOMI - BOLSONA

EJECUCION FISICA VS FINANCIERA

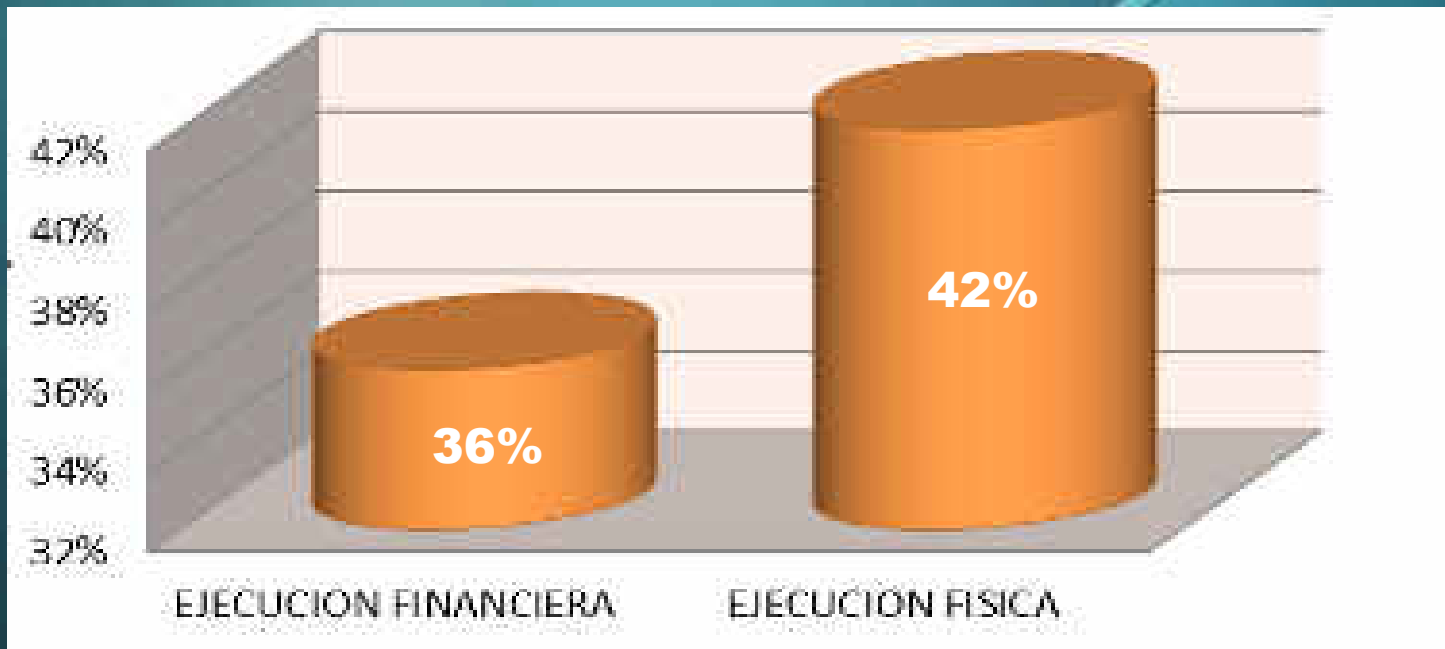

Z
O
N
A
E
C
O
N
O
M
I
C
A
E
N
D
O
Z
A
E
C
O
N
O
M
I
C
A
E
N
D
O
Z
A



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
POTOSI - BOLIVIA

TRABAJO DESARROLLADO



...!TRABAJANDO POR UNA CIUDAD DE VERDAD DEL NORTE POTOSI!..

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR GESTIÓN 2018 (ÁREA CONCENTRADA)



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA DE INICIO LOTE 1	02 de Abril
FECHA DE INICIO LOTE 2	16 de marzo
AVANCE FISICO	30%
MONTO POR CANCELAR	3,597,604

Observaciones.- beneficiarios 12.170.000 estudiantes de las 22 unidades educativas.

DATOS DEL PROGRAMA	
PRESUPUESTO PROGRAMADO	4.678.221 Bs
PRESUPUESTO EJECUTADO	1.080.617
PROVEEDOR	CAMRESA DIST. LOTE N° 1 PAN CASERO LOTE N° 2
SUPERVISOR	Alain Ojeda Daza
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión escolar 2018



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2018



ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR GESTIÓN 2018 (ÁREA DISPERSA)



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA DE INICIO:	12 de marzo
AVANCE FISICO	45%
MONTO POR CANCELAR	203.300

Observaciones.- beneficiarios 1.030 estudiantes de 18 unidades educativas Ayllu Chullpa y Ayllu Sikuya

DATOS DEL PROGRAMA G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE/2018	
PRESUPUESTO PROGRAMADO	365.940
PRESUPUESTO EJECUTADO	162.640
CONVENIO	PRODII- G.A.M.LL
SUPERVISOR	Alain Ojeda Daza
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión escolar 2018



IMAGEN ACTUAL



TRANSPORTE ESCOLAR AYLLU CHULLPA GESTIÓN 2018



DATOS DEL PROGRAMA G.A.M.LL. – MODALIDAD EXCEPCIÓN 2018	
PRESUPUESTO PROGRAMADO	400.000
PRESUPUESTO EJECUTADO	139,867,90
CONTRATISTAS	Ángel Zenteno Mitma
SUPERVISOR	Bladimir Ticona Castro
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión escolar 2018

FECHA DE INICIO ORDEN A PROCEDER	16 de marzo de 2018
AVANCE FISICO	29,76%
MONTO POR CANCELAR	260,132



TRABAJANDO



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2018

TRANSPORTE ESCOLAR AYLLU SIKUYA GESTIÓN 2018



DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE/2018	
PRESUPUESTO PROGRAMADO	300.112,00
PRESUPUESTO EJECUTADO	85,806,00
CONTRATISTAS	MARCOS GASPAR CUYO
SUPERVISOR	OMAR CRUZ
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión escolar 2018



FECHA DE INICIO:	13 de marzo de 2018
AVANCE FISICO	28,59%
MONTO POR CANCELAR	214.306,00



HOSPEDAJES ESTUDIANTILES EN FAMILIA (UYUNI, CAPUNITA Y JISKANKY)



PULLANA WASI

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL. (3 PROGRAMAS)	Bs500.000,00
MONTO EJECUTADO	Bs131296,41
SUPERVISOR	Ximena Paillo A
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión Escolar 2018

FECHA INICIO DE FUNCIONAMIENTO	Febrero / 2018
FECHA DE CULMINACION	Noviembre / 2018
AVANCE FISICO	26,26%
MONTO CANCELADO	

Observaciones.- Ninguna



PULLANA WASI



JUEGOS PLURINACIONALES UNIDADES EDUCATIVAS GESTIÓN 2018



Adquisición de ropa Deportiva

DATOS DEL PROGRAMA	
PRESUPUESTO PROGRAMADO	417.005,00 Bs
PRESUPUESTO EJECUTADO	67.005,00 Bs



FECHA DE INICIO:	MES DE MAYO
MONTO POR CANCELAR	350.000,00



APOYO AL FUNCIONAMIENTO CENTRO INTEGRAL MULTISECTORIAL SAN BENITO GESTIÓN 2018



DATOS DEL PROGRAMA	
PRESUPUESTO PROGRAMADO	198.000,00
PRESUPUESTO EJECUTADO	7.033,14

FECHA DE INICIO:	Mes de febrero hasta noviembre
MONTO POR CANCELAR	123.899,86



PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA PAPI 2018

21 CENTROS EN EL MUNICIPIO DE LLALLAGUA

16 CENTROS PAPI EN EL AREA CONCENTRADA

5 CENTROS PAPI EN EL ÁREA DISPERSA

Total de niñas y niños beneficiados 442 del área concentrada y del área dispersa

N °	CENTROS PAPI	NUMERO DE NIÑOS /NIÑAS
1.-	NUEVAS ESPERANZAS	23
2.-	Bichitos	23
3.-	Porvenir	24
4.-	Mafalda	23
5.-	8 de marzo	24
6.-	Florida II	23
7.-	Angelitos	21
8.-	Lorito	23
9.-	Cariñositos	23
10.-	Catavi	23
11.-	Piolín	20
12.-	Florida I	23
13.-	Ositos	23
14.-	Jardín de los sueños	23
15.-	Gotitas de amor	24
16.-	San Cristóbal	24

1.-	Llallaguita	15
2.-	Agua de Catilla	15
3.-	Hualqueri	15
4.-	Chayacari	15
5.-	Uyuni	145



PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA PAPI



Actividades día del niño

FECHA DE INICIO:	2 de abril
AVANCE FISICO	25 %

Observaciones.- Niñas y niños beneficiados 442 del área concentrada y del área dispersa.

DATOS DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO PROGRAMADO	1. 359.466,00 Bs
PRESUPUESTO EJECUTADO	344.467.83
SUPERVISOR	Lic. Alisson Gutiérrez Miranda
TIEMPO DE EJECUCION	10 meses



Trabajos de manualidades



PROGRAMA PAPI (Adquisición de alimentos frescos frutas y verduras)



Degustación de frutas

DATOS DEL BIEN	
PRESUPUESTO PROGRAMADO	149.385,60 Bs
PRESUPUESTO EJECUTADO	26.403,5
SUPERVISOR	Alisson Gutierrez Miranda
TIEMPO DE EJECUCION	36 semanas
Proveedor	Jenny Escarlen Mariscal

FECHA DE INICIO:	13 de mayo
------------------	------------

AVANCE FISICO	30%
---------------	-----

Observaciones.- niñas/niños beneficiados de los 21 centros PAPI del Municipio de Llallagua.



PROGRAMA PAPI (Adquisición de alimentos frescos carnes)



Alimentación centro Povenis

FECHA DE INICIO:	13 de mayo
AVANCE FISICO	30%

Observaciones.- Niñas/niños beneficiados de los 21 centros PAPI del Municipio de Llallagua .

DATOS DEL BIEN	
PRESUPUESTO PROGRAMADO	137.527,20.- Bs
PRESUPUESTO EJECUTADO	23.504,30 Bs
CONTRATISTA	PROGRAMA PAPI
SUPERVISOR	Alisson Gutiérrez Miranda
TIEMPO DE EJECUCION	36 semanas
PROVEEDOR	Jeydi Gonzales



Dibujos de Niños



UNIDAD DE DEPORTES (ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS NIVELES FORMATIVO, RECREATIVO COMPETITIVO Y DE ALTO RENDIMIENTO)



Campeonato Provincial

FECHA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15 de enero
	01 De julio
AVANCE FISICO	48%
SALDO POR EJECUTAR	258.771,00

Observaciones.- beneficiarios las Asociaciones Municipales afiliadas a la Asamblea Municipal del Deporte con Personerías Jurídicas

DATOS DEL PROGRAMA	
PRESUPUESTO PROGRAMADO	500.000,00
PRESUPUESTO EJECUTADO	241.229,00
Apoyo al Deporte	Seguimiento a las Asociaciones Municipales en sus diferentes disciplinas,
ENCARGADO	Gilbert Ballesteros C.
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión escolar 2018



APOYO IX JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES (Materiales Deportivos)



Inauguración juegos plurinacionales

FECHA DE INICIO:	7 de Mayo
AVANCE FISICO	15 de junio
MONTO POR CANCELAR	

Observaciones.- beneficiarios todas las Unidades Educativas tanto en el Nivel primario y en Nivel Secundario

DATOS DEL PROGRAMA	
PRESUPUESTO PROGRAMADO	98.000,00
PRESUPUESTO EJECUTADO	98.000,00
Materiales Deportivos Para Inicio del Campeonato	Nivel Primario y Secundario



*Inauguración Nivel secundaria
Llallagua*



PROGRAMA APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE SALUD

1 HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
H.G.M.O

3 CENTROS DE SALUD AREA
URBANA

5 PUESTOS DE SALUD AREA DISPERSA

total 9 Establecimientos
de salud

RECURSOS ASIGNADOS

FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	4,245,422 Bs
MONTO EJECUTADO	2,100,295,4 Bs

Estos recursos comprenden -El pago de sueldos del personal, servicio básicos , material de escritorio manteniendo de equipos



ADQUISICION DE NUTRIBEBES



DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD /2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	500,000,00
Adquisición de Nutribebes	499,989,60
Empresa	Sigma 21.186 bolsas
Avance Financiero	100%

ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR DE AGUA DE ALTA TEMPERATURA HOSPITAL GENERAL MADRE OBRERA



DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD /2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	216,177 Bs
Esterilizador	216,177
Empresa	
Avance Financiero	

A

Informe Semestral 2018



ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA AMBULANCIA primer y segundo nivel



DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD /2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	58.608 Bs

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE CITOLOGÍA



DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD /2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	23,208,00
Ejecutado	19,097
Empresa	
Avance Financiero	



MONITOR MULTIPARAMETRICO CON CAPNOGRAFO



DATOS DEL BIEN	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	45,000
COSTO TOTAL	49,450,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTRO BISTURI



DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD /2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	48,000,00 Bs
Adquisición de Electro bisturí	45,000,00
Empresa	TUCSON
Avance Financiero	100%



ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALUD PRIMER NIVEL

DATOS DEL PROYECTO
G.A.M.LL. – MODALIDAD /2017

FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	92,736
Mobiliario primer nivel	91,876,00
Empresa	COMERCIAL MONTREI
Avance Financiero	100%



ADQUISICION DE MEDICAMENTOS HOSPITAL GENERAL MADRE OBRERA (LEY N° 475)



Atencion medica H.G.M.O

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	Bs 621.299,05
COSTO PROYECTO	Bs 621.299,05
SUPERVISOR	Dra. Paola Tapia Gutiérrez
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión 2018

FECHA INICIO DE OBRA	GESTION 2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	GESTION 2018
AVANCE FISICO	Porcentaje 60 %
MONTO CANCELADO	En proceso de cancelación

Observaciones.- Ninguna.



MEDICAMENTOS RECIBIDOS

G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2018



ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITAL GENERAL MADRE OBRERA (LEY N° 475)



Insuomos Algodones, Gasas, Jeringas

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE 2018	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	Bs. 262.620,00
COSTO PROYECTO	Bs. 262.620,00
SUPERVISOR	Dra. Paola Tapia Gutiérrez
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión 2018

FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	GESTION 2018
AVANCE FISICO	Porcentaje 35 %
MONTO CANCELADO	En proceso de Cancelación

Observaciones.- Ninguna.



Atencion de pacientes H.G.M.O



ADQUISICION DE REACTIVOS HOSPITAL GENERAL MADRE OBRERA(LEY N° 475)



Reactivos de laboratorio

DATOS DEL PROGRAMA	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	Bs. 175.900,00
COSTO PROYECTO	Bs. 175.900,00
SUPERVISOR	Dra. Paola Tapia Gutiérrez
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión 2018

FECHA INICIO DE OBRA	GESTION 2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	GESTION 2018
AVANCE FISICO	Porcentaje 40%
MONTO CANCELADO	En Proceso de Cancelación

Observaciones.- Ninguna.



Análisis de muestra



ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PRIMER NIVEL (LEY N° 475)



Medicamentos para primer nivel

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE 2018	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	Bs. 933.348,00
COSTO PROYECTO	Bs. 933.348,00
SUPERVISOR	Dra. Paola Tapia Gutiérrez
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión 2018

FECHA INICIO DE OBRA	GESTION 2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	GESTION 2018
AVANCE FISICO	Porcentaje 64,00 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 602.898,,00

Observaciones.- Ninguna.



atención centro de salud



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2018

ADQUISICION DE MICRONUTRIENTES Y ALIMENTO CARMELO



RECEPCION DE ALIMENTO CARMELO

DATOS DEL PROYECTO	
G.A.M.LL. – MODALIDAD DIRECTA 2018	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	Bs. 602.848,
COSTO PROYECTO	Bs. 602.848
SUPERVISOR	Dra. Paola Tapia Gutiérrez
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión 2018

FECHA INICIO DE OBRA	GESTION 2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	GESTION 2018
AVANCE FISICO	Porcentaje 64,00 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 602.898,,00


Observaciones.-Ninguna.



Entrega de chispitas



DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DNA



Nº	CASOS ATENDIDOS PRIMER SEMESTRE	Nº
1.-	Maltrato Físico	06
2.-	Asistencia Familiar	39
3.-	Apoyo Psicológico	15
4.-	Irresponsabilidad Materna	14
5.-	Irresponsabilidad Paterna	02
6.-	Menor Extraviada	14
7.-	Incremento de Asistencia Familiar	06
8.-	Tenencia Ilegal de Menor	03
9.-	Maltrato Físico y Psicológico	01
10.-	Incumplimiento de Asistencia Familiar	03
11.-	Conflicto de Visitas	14
12.-	Adolescentes con Problemas de Conducta	02
13.-	Maltrato Psicológico	02
14.-	Adolescentes con Conflictos con la Ley	02

15.-	Irresponsabilidad de ambos Progenitores	01
16.-	Conflictos de Guarda	05
17.-	Guarda Temporal	06
18.-	Explotación Laboral	02
19.-	Utilizaciones de la NNA en Conflictos Familiares	01
20.-	Liquidación de Asistencia Familiar en la Vía Conciliatoria	01
21.-	Cesación de Asistencia Familiar	01
22.-	Abandono de menor por la progenitora	01

TOTAL CASOS 141



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2018

SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL SLIM



ACTIVIDADES REALIZADAS

PREVENCIÓN Y
DIFUSIÓN

- Campaña de prevención en contra de la violencia de la familia.
- Feria municipal de socialización y prevención del Cáncer Cervico Uterino.
- Taller de Liderazgo Actividad dirigida a mujeres del municipio.
 - Taller El Rol del Padre en la Familia.
 - Talleres de prevención de violencia en el enamoramiento dirigido a jóvenes estudiante del municipio.
- Brigadas de Sensibilización "Practicar el Buen Trato en el Hogar".
- Talle Importancia de la familia en el ser humano.

TIPOLOGÍA	TOTAL
Violencia en la Familia	28
Violencia Física	6
Violencia Psicológica	5
Violencia Patrimonial y Económica	56
Violencia contra la Dignidad ,el Honra y el Nombre	41
Violencia contra los Derechos y La Libertad Sexual.	1
Violencia Sexual	2
Violencia Institucional	1
Violencia contra los Derechos Reproductivos.	1
violencia Laboral	3
Otro Tipo de Violencia (Abandono Familiar)	14
TOTAL	165



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2018

UNIDAD DEL ADULTO MAYOR



TIPOLOGÍA	TOTAL
Violencia Psicológica	1 caso
Violencia Patrimonial y Económica	24 casos
Violencia contra la Dignidad ,el Honra y el Nombre	8 casos
Violencia Sexual	1 caso
Violencia Institucional	1 caso
TOTAL	35 CASOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Taller sobre nutrición y alimentación para personas adultas mayores. - Prestación de servicios de apoyo psicológico, social y legal a personas adultos mayores víctima de violencia Intra familiar. - Se ha brindado orientación y patrocinio legal gratuito en instancias administrativas y policiales en beneficio de las personas adultas mayores. - Se ha desarrollado acciones de prevención, socialización y difusión de la Ley N° 369 (Ley General de las Personas Adultas Mayores)
-----------------------	---



SEGURIDAD CIUDADANA



Gastos de Funcionamiento.

MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO	SALDO	%
310.557	73.091,12	237.466.	23%

Gastos de Equipamiento.

MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO	SALDO	%
200.000	24.100	175.900	12 %

Monto Total Ejecutado.

TOTAL MONTO PROGRAMADO.	MONTO EJECUTADO	SALDO	%
510. 557.	97.191,12	413.366.	35%

Gasto total de combustible mensual
 por semana carguío 3.100. bs.-
 por mes 12.400 bs.-
 por año real 148.000 bs.-
 presupuestado 200.000.- y planificado.
 que nos permiten realizar operativos de plan tukuy rikuy, mochila segura, papa seguro y el correspondiente patrullaje en nuestro municipio.



SEGURIDAD CIUDADANA

Gastos de Funcionamiento.



• TRABAJOS REALIZADOS .

- asegurar las 3 camionetas hilux de la policia regional llallagua. vigencia hasta el mes de sept. 2018.
- mejoramiento de la tranca de ingreso a nuestro municipio de llallagua.
- realizar planes de seguridad ciudadana en nuestro municipio como son: fiestas patrias, festividad de la virgen de la asuncion, navidad y año nuevo. y los planes emergentes a efectos de dar seguridad dentro nuestro municipio de llallagua.



CASOS ATENDIDOS 2018

CASOS	ENE	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
DELITOS	36	16	24	41	51	28	196
FALTAS Y CONTRAVENCIONES	13	8	14	12	6	20	73
HECHOS DE DE TRANSITO	2		2	1			5
INFRACCIONES DE TRANSITO	23	22	22	38	14	9	128
AUXILIO	21	14	19	23	12	8	97
TOTAL	95	60	81	115	83	65	499

UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD



DATOS DEL PROGRAMA	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	40,000 Bs.
UNIDAD	Unidad Municipal de Apoyo a la Discapacidad.
RESPONSABLE	Lic. Rossio E. Carvajal Ch.
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión 2018




PERSONAS CON DISCAPACIDAD REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO DE LLALLAGUA	
Discapacidad Auditiva	35
Discapacidad Físicas Motoras	70
Discapacidad Intelectual	59
Discapacidad Múltiple	50
Discapacidad Psíquico	2
Total	216



UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD (ley 977 Ayuda Económica)



Presupuesto programado
2018
Bs 624.000,00



Presupuesto ejecutado Bs. 162.750,00



ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA LLALLAGUA



DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD AMPE/2018	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	100%
COSTO PROYECTO	939.742,00 Bs.-
CONTRATISTA	MANUFACTURAS METALICAS "VOLCAN"
SUPERVISOR	COMISION DE RECEPCION DE BIENES
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C

FECHA INICIO DE LA ADUISION	06/Febrero/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	06/MARZO/2018
AVANCE FISICO	Porcentaje 100 %
MONTO CANCELADO	939.742,00 Bs.-
MONTO POR PAGAR	0.00 Bs.-



Observaciones.-

G.A.M. LLALLAGUA

Informe semestral 2018



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

POTOSI - BOLIVIA



Infraestructura



CONSTRUCCION MERCADO DE SIGLO XX OBRA FINA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	14/12/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	16/03/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	13/06/2018
AVANCE FISICO	100%
MONTO CANCELADO	989.320,63 Bs.

Observaciones.- Falta devolución de garantías.

DATOS DEL PROYECTO

COSTO DEL PROYECTO	989.320,63 Bs.
CONTRATSITA	VIGEL-TEC
SUPERVISOR	Ing. Marco Antonio Cosso M.
TIEMPO DE EJECUCION	87 D/C



IMAGEN ACTUAL



CONSTRUCCION MODULO POLICIAL CAMPAMENTO SALVADORA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	14/03/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	16/05/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	100%
MONTO CANCELADO	98,000,00 Bs.

Observaciones.- FALTA DEVOLUCION DE GARANTIAS



DATOS DEL PROYECTO	
COSTO DEL PROYECTO	98,000,00 Bs.
CONTRATSITA	CEDY-GAF
SUPERVISOR	Ing. Marco Antonio Cosso M.
TIEMPO DE EJECUCION	50 D/C



IMAGEN ACTUAL

AMPLIACION UNIDAD EDUCATIVA SIGLO XX



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	30/04/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	29%
MONTO CANCELADO	0,00 Bs.

Observaciones.- SE REALIZO UN CONTRATO MODIFICATORIO n° 1, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO

COSTO DEL PROYECTO	
CONTRATISTA	EMPRESA CONSTRUCTORA CASTELO
SUPERVISOR	Ing. Marco Antonio Cosso M.
TIEMPO DE EJECUCION	155 D/C



IMAGEN ACTUAL



CONSTRUCCION PLAZA UNIVERSITARIA CAMPAMENTO 5 PARTE BAJA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	01/06/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	16%
MONTO CANCELADO	0,00 Bs.

Observaciones.- La obra se encuentra en plena ejecución.

DATOS DEL PROYECTO

COSTO DEL PROYECTO	248,672,50 Bs.
CONTRATISTA	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA "P,C,Y,"
SUPERVISOR	Ing. Marco Antonio Cosso M.
TIEMPO DE EJECUCION	65 D/C



IMAGEN ACTUAL



CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PARA PORTERIA CENTRO HABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDA



IMAGEN ANTES DEL PROYECTO

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	28.700 - 28.694,28 Bs
COSTO PROYECTO	28.694,28 Bs
CONTRATISTA	UNIPERSONAL "LUCY LOPEZ NUÑEZ DE DIAS"
SUPERVISOR	Arq. Edwin W. Rengel Fernandez
TIEMPO DE EJECUCION	35 D/C



FECHA INICIO DE OBRA	29/12/2017
FECHA ORDEN A PROCEDER	23/01/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	26/02/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	28/03/2018
AVANCE FISICO	100.00 %
AVANCE FINANCIERO	93,00 %
MONTO CANCELADO	26.685,68 Bs

Observaciones.- La obra encuentra concluida se presento devolución de garantías por retención del 7% g.C.C. (Garantía de cumplimiento de contrato)



IMAGEN ACTUAL

CONSTRUCCION DE DOS AMBIENTES CENTRO DE SALUD CATAVI



IMAGEN ANTES DEL PROYECTO

DATOS DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	80,00 - 76.065,46 Bs
COSTO PROYECTO	76.065.46 Bs
CONTRATISTA	EMPRESA CONSTRUCTORA "YATO"
SUPERVISOR	Arq. Roly Fernández Arq. Edwin W. Rengel Fernandez
TIEMPO DE EJECUCION	59 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	29/11/2017
FECHA ORDEN A PROCEDER	29/11/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	26/01/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	25/02/2018
AVANCE FISICO	100,00 %
AVANCE FINANCIERO	0,00 %
MONTO CANCELADO	0,00 Bs



IMAGEN ACTUAL

Observaciones.- La obra encuentra concluida sin desembolso de la primera planilla presentada en la fecha 13 de diciembre 2017. Con un ORDEN DE TRABAJO N°1 por redistribución de cantidades incremento y decremento de volúmenes. SIN variación en el monto de contrato.

CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD CATAVI



IMAGEN ANTES DEL PROYECTO

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	100,00 – 99.793,41 Bs
COSTO PROYECTO	99.793,41 Bs
CONTRATISTA	EMPRESA CONSTRUCTORA UNIPERSONAL ELECTRO POOL CONSTRUCTORA & CONSULTORA
SUPERVISOR	Arq. Edwin W. Rengel Fernandez
TIEMPO DE EJECUCION	35 D/C



FECHA INICIO DE OBRA	30/05/2018
FECHA ORDEN A PROCEDER	11/06/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	15/07/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	POR DEFINIR
AVANCE FISICO	40,00 %
AVANCE FINANCIERO	0,00 %
MONTO CANCELADO	0,00 Bs



IMAGEN ACTUAL

Observaciones.- La obra se encuentra en ejecución.

CONSTRUCCION DE BARANDAS METALICAS BALNEARIO CATAVI



IMAGEN ANTES DEL PROYECTO

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	22.461,00 - 22.460,00 Bs
COSTO PROYECTO	22,460,00 Bs
CONTRATISTA	EMPRESA UNIPERSONAL CONSULTORA CONSTRUCTORA SERVICIOS INTERGALES "MILGELH"
SUPERVISOR	Arq. Edwin W. Rengel Fernandez
TIEMPO DE EJECUCION	13 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	29/01/2018
FECHA ORDEN A PROCEDER	29/01/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	10/02/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	12/03/2018
AVANCE FISICO	100,00 %
AVANCE FINANCIERO	0,00 %
MONTO CANCELADO	0,00 Bs



IMAGEN ACTUAL

Observaciones.- La obra encuentra concluida y cerrada. sin desembolso de la primera planilla presentada en el mes de Abril 2018.

REFACCION RESTAURANTE DE LA PISCINA 1° DE MAYO



IMAGEN ANTES DEL PROYECTO

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	26.600,00 Bs
COSTO PROYECTO	26,6000,00 Bs
CONTRATISTA	EMPRESA UNIPERSONAL CONSULTORA CONSTRUCTORA SERVICIOS INTERGALES "MILGELH"
SUPERVISOR	Arq. Edwin W. Rengel Fernandez
TIEMPO DE EJECUCION	22 D/C



FECHA INICIO DE OBRA	02/02/2018
FECHA ORDEN A PROCEDER	02/02/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	23/02/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	25/03/2018
AVANCE FISICO	100,00 %
AVANCE FINANCIERO	0,00 %
MONTO CANCELADO	0,00 Bs



IMAGEN ACTUAL

Observaciones.- La obra encuentra concluida y sin desembolso de la primera planilla presentada en el mes de Abril 2018

REFACCION (CANCHA POLIGIMNACIO CATAVI)



IMAGEN ANTES DEL PROYECTO

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	200.00 - 197.027,73 Bs
COSTO PROYECTO	167.027,73 Bs
CONTRATISTA	EMPRESA UNIPERSONAL "ROLANDO CHAMBI QUISPE"
SUPERVISOR	Arq. Edwin W. Rengel Fernandez
TIEMPO DE EJECUCION	80 D/C



FECHA INICIO DE OBRA	20/03/2018
FECHA ORDEN A PROCEDER	21/03/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	08/06/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	06/09/2018
AVANCE FISICO	100,00 %
AVANCE FINANCIERO	0,00 %
MONTO CANCELADO	0,00 Bs

Observaciones.- La obra encuentra concluida y cerrada. sin desembolso de la primera planilla presentada en el mes de Mayo 2018. Con un ORDEN DE TRABAJO N°1 por redistribución de cantidades incremento y decremento de volúmenes. SIN variación en el monto de contrato.



IMAGEN ACTUAL

CONSTRUCCION LABORATORIOS AULAS TECNICAS U.E. JUNIN - CATAVI



IMAGEN ANTES DEL PROYECTO

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	2971287,53 - 2969688,08 Bs
COSTO PROYECTO	2969688,08 Bs.
CONTRATISTA	EMPRESA: SERVICIO EN CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA NICOBOL
SUPERVISOR	Arq. Gonzalo Fernando Vásquez Arq. Edwin W. Rengel Fernandez
TIEMPO DE EJECUCION	250 D/C



FECHA INICIO DE OBRA	22/12/2017
FECHA ORDEN A PROCEDER	22/12/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	28/08/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	POR DEFINIR
AVANCE FISICO	68,00 %
AVANCE FINANCIERO	25,47 %
MONTO CANCELADO	162.381,28 Bs

Observaciones.- La obra encuentra en ejecución con un ORDEN DE CAMBIO N°1 por redistribución de cantidades incremento y decremento de volúmenes. SIN variación en el monto de contrato.



IMAGEN ACTUAL

AMPLIACION DE AGUA SECTOR PLAZA CALAMA PARTE ALTA ZONA 8



DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	38,003,45Bs.
COSTO DEL PROYECTO	0,00BS.
CONTRATSITA	AGU.PO.M.
SUPERVISOR	Arq. Jose Luis Siles Verduguez
TIEMPO DE EJECUCION	60 D/C



FECHA INICIO DE OBRA	29/03/2018
FECHA ORDEN A PROCEDER	29/03/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	17/04/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	POR DEFINIR
AVANCE FISICO	100 %
AVANCE FINANCIERO	0,00 %
MONTO CANCELADO	0,00 Bs

Observaciones.- El informe entregado por parte de la comisión de calificación en fecha 03 de julio donde se califico con un ganador que esta en proceso de validación en instancias consiguientes.

IMAGEN ACTUAL

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAKAMARKA



DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	150,000,00 Bs.
COSTO DEL PROYECTO	0,00 BS.
CONTRATSITA	TIQUE
SUPERVISOR	Arq. Jose Luis Siles Verduguez
TIEMPO DE EJECUCION	60 D/C



FECHA INICIO DE OBRA	10/12/2017
FECHA ORDEN A PROCEDER	10/12/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	27/12/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	15/01/2018
AVANCE FISICO	100 %
AVANCE FINANCIERO	75 %
MONTO CANCELADO	0,00 Bs



Observaciones.- Se entrego definitivamente este proyecto se espera por que la empresa cobre

IMAGEN ACTUAL

EN CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCION DE INVERNADEROS FAMILIARES PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN EL DISTRITO AYLLU CHULLU MUNICIPIO LLALLAGUA

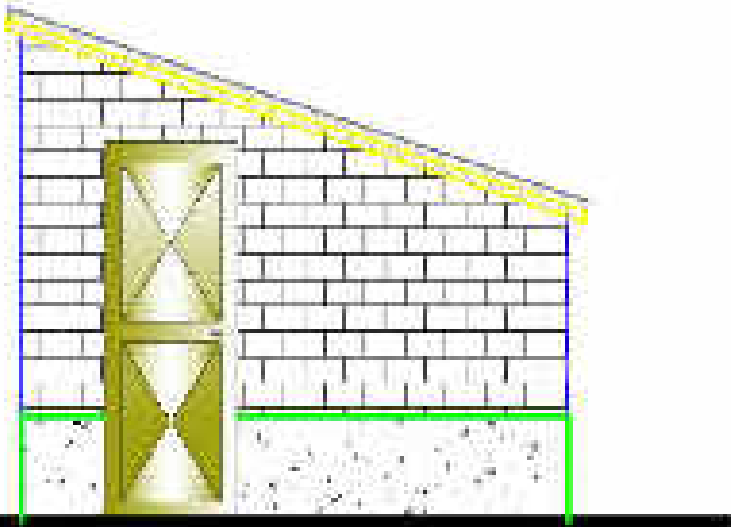


IMAGEN DEL INVERNADERO A CONSTRUIRSE

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	3.300.000,00 Bs
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO	
FONDO DE DASARROLLO INDIGENA	100 %
CONTRATISTA	Fausto Mitma Ticona
SUPERVISOR	
TIEMPO DE EJECUCION	150 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	22/06/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	

Observaciones.- El proyecto se encuentra en ejecución.

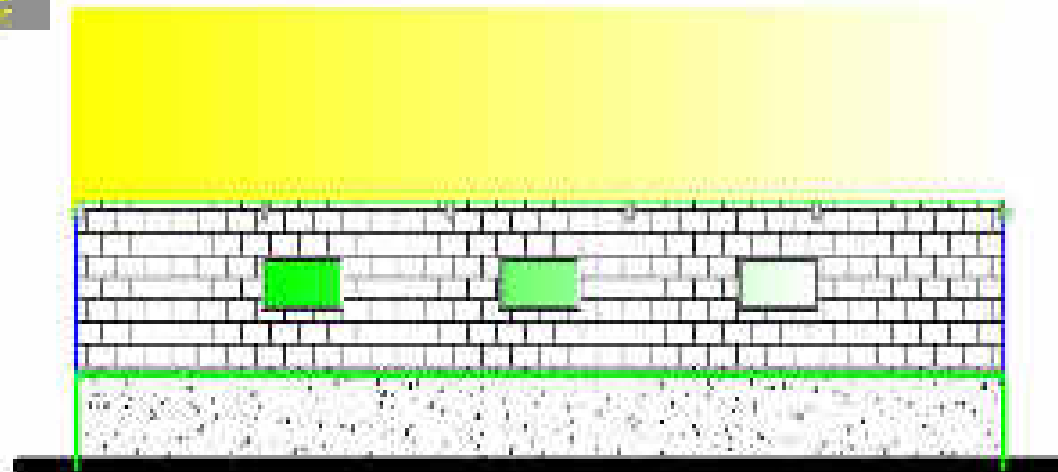


IMAGEN DEL INVERNADERO A CONSTRUIRSE

ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION "SIST AGUA POTABLE CHOJLLUMA AYLLU CHULLPA



IMAGEN DURANTE TRABAJO DE CAMPO

FECHA INICIO DE CONSULTORIA	01/12/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	15/12/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	14/01/2018
AVANCE FISICO	100 %

Observaciones.- La Consultoría fue Concluido, el proyecto se debe remitir al MMAyA para su financiamiento a la cual se debe hacer seguimiento.

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO DE CONSULTORIA	37.500,00 Bs
CONSULTORA	PERDAF SRL
SUPERVISOR	Ing. David Pérez Mamani
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C



SOCIALIZACION DEL PROYECTO

ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE JISKANQUI AYLLU CHULLPA



DATOS DEL PROYECTO	
COSTO DE CONSULTORIA	37.500,00 Bs
CONSULTORA	SINCHIKALLPA
SUPERVISOR	Ing. David Pérez Mamani
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C

COMUNIDAD DE ESTUDIO

FECHA INICIO DE CONSULTORIA	29/12/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	29/12/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	26/01/2018
AVANCE FISICO	100 %

Observaciones.- La Consultoría fue concluido, y para el proyecto EDTP se debe realizar el seguimiento hasta lograr el financiamiento.



ESQUEMA DEL ESTUDIO DE PROYECTO

CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE HUAYLLOMA AYLLU CHULLPA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	05/12/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	20/12/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	19/01/2018
AVANCE FISICO	100 %

Observaciones.- La obra se encuentra en concluido y cerrado.

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	36,499.64 Bs
CONTRATISTA	Julián Ticona Mitma
SUPERVISOR	Ing. David Pérez Mamani
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C



IMAGEN DURANTE SU EJECUCION

ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION MANEJO INTEGRAL MICROCUENCA ESCALERANI



DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	140.000,00 Bs
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO	
PNC	98.000,00 Bs.
DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	140.000,00 Bs
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO	
PNC	98.000,00 Bs.
G.A.M. Llallagua	42.000,00 Bs.
Contratista	SETEA SRL
Supervisor	David Perez Mamani

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	29/05/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	20 %

Observaciones.- El EDTP se encuentra en ejecución.



IMAGEN DURANTE SU EJECUCION

CONSTRUCCION ENMALLADO VILLA 1 RO DE MAYO WALQUERI



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	0 %

Observaciones.- La obra se encuentra en proceso de contratación.

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	100,000.00 Bs
CONTRATISTA	
SUPERVISOR	
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C



IMAGEN DURANTE SU EJECUCION

CONSTRUCCION ENMALLADO CANCHA POLIFUNCCIONAL AGUA DE CASTILLA AYLLU CHULLPA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	38.941,02 Bs
CONTRATISTA	Fabio Colquechuima Jachacollo
SUPERVISOR	David Pérez Mamani
TIEMPO DE EJECUCION	15 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	28/05/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	12/06/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	100 %

Observaciones.- La obra se encuentra en concluido físicamente solo falta hacer la planilla de cierre.



IMAGEN DURANTE SU EJECUCION

CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL RANCHO KUCHO AYLLU SIKUYA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	Bs. 84,629.21.-
CONTRATISTA	EMPRESA CONTRATISTA "TOCO"
SUPERVISOR	Omar Cruz Villegas
TIEMPO DE EJECUCION	45 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	19/02/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	23/02/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	03/04/2018
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	Bs. 84,629.21.-
MONTO POR PAGAR	0 Bs

Observaciones.- proyecto cerrado



IMAGEN ACTUAL



Proyecto y/o Actividad: CONSTRUCCIÓN ENMALLADO TANQUE MACHAYA CALA AYLLU SIKYA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	Bs. 41,724.08.-
CONTRATISTA	REYMUNDO COLQUE CHACA
SUPERVISOR	Omar Cruz Villegas
TIEMPO DE EJECUCION	22 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	17/04/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	16/05/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	14/06/2018
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	BS. 41,724.08.-
MONTO POR PAGAR	0 Bs



IMAGEN ACTUAL

Observaciones.- Proyecto Cerrado



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2018

Proyecto y/o Actividad: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SACA SACA AYLLU SIKUYA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	Bs. 49,136.70.-
CONTRATISTA	EMPRESA CONSTRUCTORA "YAPURA"
SUPERVISOR	Omar Cruz Villegas
TIEMPO DE EJECUCION	37 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	11/05/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	15/06/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	Bs,49,136.70.-
MONTO POR PAGAR	0 Bs

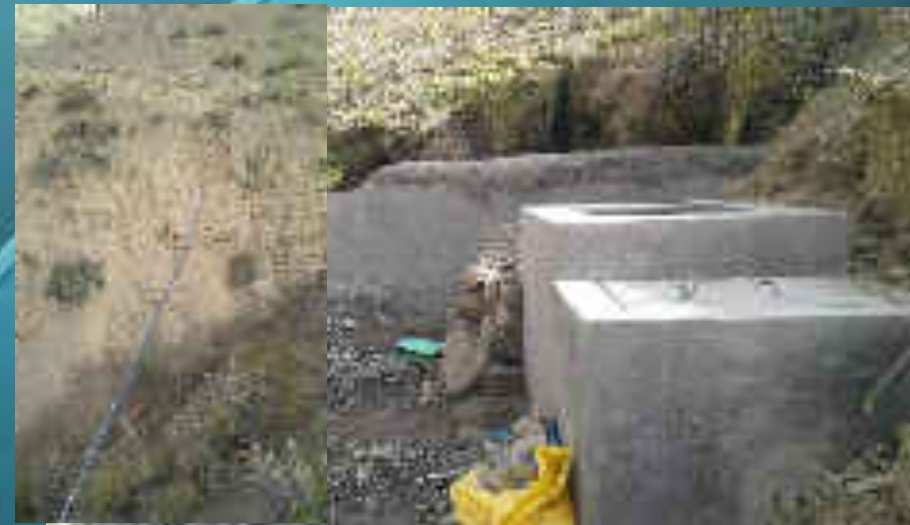


IMAGEN ACTUAL

Observaciones.- Proyecto Concluido



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2018

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CALLE ARCE DISTRITO LLALLAGUA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – 2018	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	100%
COSTO PROYECTO	895,521,48
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA "CALVIMONTES A.C."
SUPERVISOR	Arq. Amílcar M. Alberto Terrazas
TIEMPO DE EJECUCION	121 D/C



IMAGEN ACTUAL

FECHA INICIO DE OBRA	18/10/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	22/03/2018
< FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	18/06/2018
AVANCE FISICO	100%
MONTO CANCELADO	895,521,48 Bs.-
MONTO POR PAGAR	00,000,00 Bs.-

Observaciones.- La obra sufio un contrato modificatorio con incremento de 77,223,42 Bs. Que representa el 9,43% del total de la obra.



CONSTRUCCIÓN ESTADIO IRINEO PIMENTEL ROJAS MUNICIPIO DE LLALLAGUA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – 2018	
FINANCIAMIENTO U.P.R.E.	100%
COSTO PROYECTO	29,674,611,48 Bs.
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA "CONAC – PREYCON LTDA"
SUPERVISOR	Arq. Amílcar M. Alberto Terrazas
TIEMPO DE EJECUCION	580 D/C



IMAGEN ACTUAL

FECHA INICIO DE OBRA	22/12/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	24/07/2019
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	13,53%
MONTO CANCELADO	3,632,210,71Bs.-
MONTO POR PAGAR	26,042,401,40Bs.-

Observaciones.- NINGUNA



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2018

CONSTRUCCIÓN BAÑO HIGIÉNICO SECTOR PÓSITOS ZONA 7



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.L.L. – 2018	
FINANCIAMIENTO G.A.M.L.L.	100 %
COSTO PROYECTO	84,393,01 Bs.
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA "CASTELO"
SUPERVISOR	Arq. Amílcar M. Alberto Terrazas
TIEMPO DE EJECUCION	70 D/C



IMAGEN ACTUAL

FECHA INICIO DE OBRA	24/11/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	05/02/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	05/04/2018
AVANCE FISICO	100,00%
MONTO CANCELADO	84,393,01 Bs.-
MONTO POR PAGAR	00,000,00 Bs.-

Observaciones.- NINGUNA



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2018

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN MODULO GAVIONES COLEGIO LLALLAGUA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – 2018	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	100,00%
COSTO PROYECTO	888,411,08
CONTRATISTA	EMPRESA CONSTRUCTORA "CARUSE"
SUPERVISOR	Arq. Amílcar M. Alberto Terrazas
TIEMPO DE EJECUCION	213 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	05/12/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	10/07/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	07/09/2018
AVANCE FISICO	100,00%
MONTO CANCELADO	808,199,14 Bs.-
MONTO POR PAGAR	80,211,94 Bs.-

Observaciones.- La obra sufrió un contrato modificatorio con un incremento económico de 77,366,55 Bs. Que representa el 9,53% del monto total de la obra y una ampliación de plazo de 143 D/C a causa de paralización de obra y creación de nuevos ítems.



IMAGEN ACTUAL



REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CENTRO DE SALUD MADRE OBRERA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. - 2018	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	100,00%
COSTO PROYECTO	41,590,05 Bs.
CONTRATISTA	EMPRESA CONSTRUCTORA "G.V.P."
SUPERVISOR	Arq. Amílcar M. Alberto Terrazas
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C



IMAGEN ACTUAL

FECHA INICIO DE OBRA	30/04/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	16/05/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	14/06/2018
AVANCE FISICO	100,00%
MONTO CANCELADO	41,590,05 Bs.-
MONTO POR PAGAR	00,000,00 Bs.-

Observaciones.- NINGUNA



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2018

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO AV. 31 DE OCTUBRE



DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – 2018	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	100,00%
COSTO PROYECTO	149,837,69 Bs.
CONTRATISTA	EMPRESA UNIPERSONAL ELVIS SURUMI ACHO
SUPERVISOR	Arq. Amílcar M. Alberto Terrazas
TIEMPO DE EJECUCION	45 D/C

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	07/05/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	21/06/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	20/08/2018
AVANCE FISICO	100,00%
MONTO CANCELADO	149,837,69 Bs.-
MONTO POR PAGAR	00,000,00 Bs.-

Observaciones.- NINGUNA



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2018

CONSTRUCCIÓN COCINA COLEGIO 1° DE MAYO C OBRA FINA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – 2018	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	100,00%
COSTO PROYECTO	47,372,51 Bs.
CONTRATISTA	EMPRESA CONSTRUCTORA "YATO"
SUPERVISOR	Arq., Amílcar M. Alberto Terrazas
TIEMPO DE EJECUCION	40 D/C



FECHA INICIO DE OBRA	28/02/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	06/04/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	05/05/2018
AVANCE FISICO	100,00%
MONTO CANCELADO	47,372,51 Bs.-
MONTO POR PAGAR	00,000,00 Bs.-

Observaciones.- NINGUNA



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2018

CONCLUSIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL ZONA 3



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – 2018	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	100,00%
COSTO PROYECTO	63,921,15 Bs.
CONTRATISTA	EMPRESA CONSTRUCTORA "HILARIÓN PACARA JORGE"
SUPERVISOR	Arq., Amílcar M. Alberto Terrazas
TIEMPO DE EJECUCION	39 D/C



IMAGEN ACTUAL

FECHA INICIO DE OBRA	14/03/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	20/04/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	18/06/2018
AVANCE FISICO	100,00%
MONTO CANCELADO	63,921,15 Bs.-
MONTO POR PAGAR	00,000,00 Bs.-

Observaciones.- NINGUNA



REFACCIÓN TERMINAL DE BUSES LLALLAGUA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. - 2018	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	100,00%
COSTO PROYECTO	392,071,53 Bs.
CONTRATISTA	EMPRESA CONSTRUCTORA "G.V.P."
SUPERVISOR	Arq., Amílcar M. Alberto Terrazas
TIEMPO DE EJECUCION	83 D/C



IMAGEN ACTUAL

FECHA INICIO DE OBRA	31/05/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	25/08/2018
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	24/10/2018
AVANCE FISICO	79,81,00%
MONTO CANCELADO	311,056,03 Bs.-
MONTO POR PAGAR	81,015,50 Bs.-

Observaciones.- NINGUNA



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2018

CERCADO PAMPAS MARIA BARZOLA



DATOS DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO G.A.M.P.	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	
COSTO PROYECTO	
CONTRATISTA	ADMINISTRACION DIRECTA - RECURSOS UNIDAD DE DEPORTES
SUPERVISOR	Sr. GERMAN QUISPE POMA
TIEMPO DE EJECUCION	8 DIAS

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	
MONTO CANCELADO	
MONTO POR PAGAR	

Observaciones.- Cierre de Predios Pampas Maria Barzola, con calaminas usadas, bolillos y listones, con el fin de evitar el constante loteamiento clandestino por personas inescrupulosas.



IMAGEN ACTUAL



REFACCION FACHADA KINDER LITORAL



DATOS DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO G.A.M.P.	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	
COSTO PROYECTO	
CONTRATISTA	ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR	Sr. GERMAN QUISPE POMA
TIEMPO DE EJECUCION	30 DIAS

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	
MONTO CANCELADO	
MONTO POR PAGAR	

Observaciones.- Refacción parcial de fachada y repintado total exterior Unidad Educativa Kinder Garten “Litoral”, solo mano de obra con contra parte material a cargo de la Unidad Educativa.



IMAGEN ACTUAL



MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS



DATOS DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO G.A.M.P.	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	
COSTO PROYECTO	
CONTRATISTA	ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR	Sr. GERMAN QUISPE POMA
TIEMPO DE EJECUCION	2 SEMANAS

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	
MONTO CANCELADO	
MONTO POR PAGAR	



Observaciones.- Corrección de enlosetado calle Catavi entre las calles Mariscal Santa Cruz y Uyuni Zona 4.

IMAGEN ACTUAL



MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	
MONTO CANCELADO	
MONTO POR PAGAR	

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.P.	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	
COSTO PROYECTO	
CONTRATISTA	ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR	Sr. GERMAN QUISPE POMA
TIEMPO DE EJECUCION	8 DIAS HABILES



IMAGEN ACTUAL

Observaciones.-Apertura de camino de la Comunidad Chiru Chiru a Río Verde Ayllu Sikuya, trabajo realizado con Tractor a Orugas por el lapso de 8 días.



ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CONSTRUCCIO RED MEDIA TENSION CAMPAMENTO 2 B



IMAGEN ANTERIOR

Observaciones.- Ejecutado 95 %

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD NN/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	DIRECCION DE LUZ Y FUERZA LLALLAGUA
COSTO PROYECTO	49.938,00 Bs.
CONTRATISTA	ADMINISTRACION DIRECTA MANO DE OBRA
SUPERVISOR	Ing. Jhonny Osnayo Montaño
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C



Consultoría: Equipo Multidisciplinario (Minutacion)



DATOS DEL PROYECTO (CONSULTORIAS) CONVENIO G.A.M.P. Y G.A.M.LL.	
FINANCIAMIENTO G.A.M.P.	0,00 Bs
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	66,904,01 Bs
COSTO CONSULTORIA	66,904,01 Bs
CONTRATISTA	Abg. Richarth Copa Colque Lic. Marisabel Calizaya Corpa Lic. Elizabeth Padilla Villca
SUPERVISOR	Arq. Gumert Torrez Miranda
TIEMPO DE EJECUCION	Ocho Meses



FECHA INICIO	02/05/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE	25,00 %
MONTO CANCELADO	8,118,01 Bs
MONTO POR PAGAR	58,786,00 Bs

Observaciones.- Habiéndose iniciado ya los trabajos para el proceso de Minutacion, el Equipo Multidisciplinario ya realizo la verificación y proceso que corresponde un total de 112 carpetas, de los cuales:

- ❖ BARRIO MUNICIPAL : 12 Beneficiarios
- ❖ VANGUARDIA II : 13 Beneficiarios
- ❖ MARIA BARZOLA : 22 Beneficiarios
- ❖ VILLA NUEVA ESPERANZA : 65 Beneficiarios


Paralelamente se van subsanando las observaciones



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2018

Consultoría: Plano Director Distrito Siglo XX

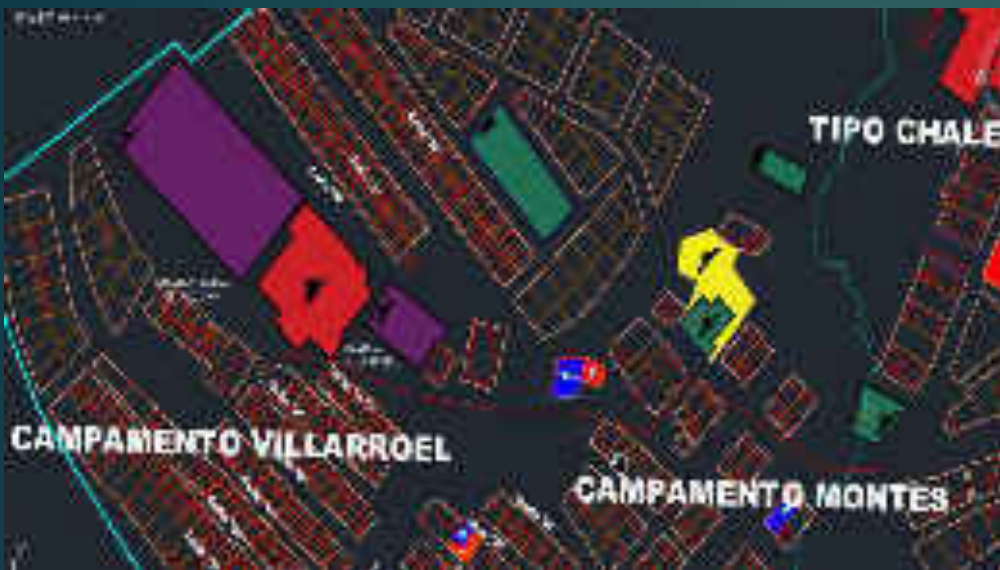

DATOS DEL PROYECTO (CONSULTORIA) CONVENIO G.A.M.P. Y G.A.M.LL.	
FINANCIAMIENTO G.A.M.P.	0,00 Bs
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	46.650,00 Bs
COSTO CONSULTORIA	46.650,00 Bs
CONTRATISTA	Arq. Reynaldo Medrano Ibáñez
SUPERVISOR	Arq. Gumert Torrez Miranda
TIEMPO DE EJECUCION	Diez Meses

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO	01/03/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE	40,00 %
MONTO CANCELADO	9.330,00 Bs
MONTO POR PAGAR	37,320,00 Bs

Observaciones.- La Consultoría va ejecutándose tanto en la recopilación de la información de los vecinos de Siglo XX, y la planificación urbana por zonas.

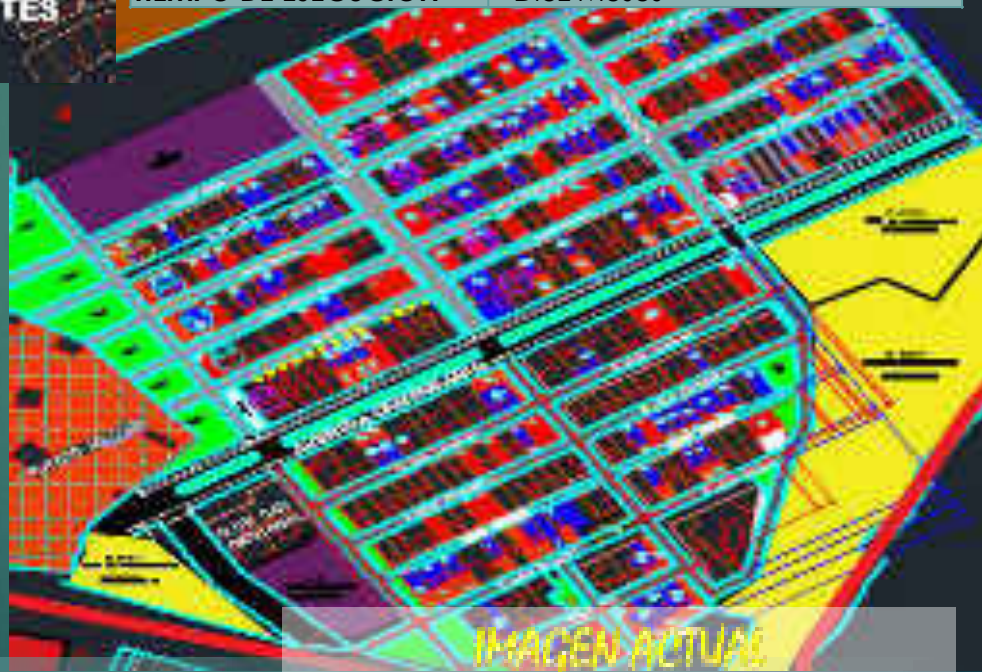


IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2018

Consultoría: Plano Director Distrito Catavi



DATOS DEL PROYECTO (CONSULTORIA) CONVENIO G.A.M.P. Y G.A.M.LL.

FINANCIAMIENTO G.A.M.P.	0,00 Bs
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	37.237,50 Bs
COSTO CONSULTORIA	37.237,00 Bs
CONTRATISTA	Arq. Luis Alberto Mamani Parrilla
SUPERVISOR	Arq. Gumert Torrez Miranda
TIEMPO DE EJECUCION	Siete Meses y Quince Días



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO	01/03/2018
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE	20,00 %
MONTO CANCELADO	4.665,00 Bs
MONTO POR PAGAR	32,572,50 Bs

Observaciones.- La Consultoría va ejecutándose inicialmente en la recopilación de la información de los vecinos de Siglo XX, y la planificación urbana por zonas.



IMAGEN ACTUAL




G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2018


Resumen Actividades y funciones propias de la Unidad de Ordenamiento Territorial



PLANOS EQUIPAMIENTO



PERFILES DE PROYECTO

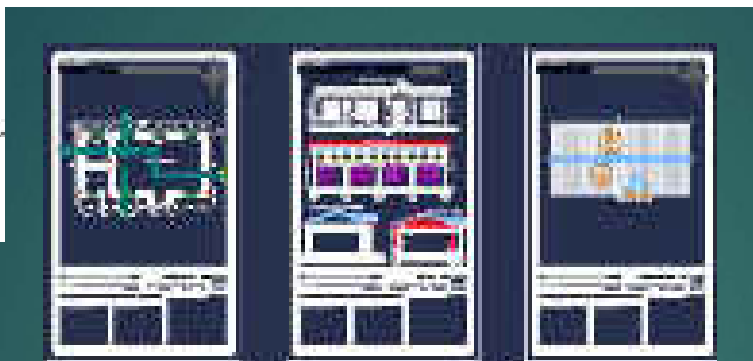

ENTREGA DE CARPETAS A.E. VIVIENDA



TRAMITES DE APROBACION



PROCESO DE SANEAMIENTO

Actividad	Descripción	Cantidad
INFORMES TECNICOS VARIOS		117
INICIO DE TRAMITES DE SANEAMIENTO DE TERRENOS		14
ELABORACION DE PLANOS DE EQUIPAMIENTOS G.A.M.LL.		3
PERFILES DE PROYECTO		2
ENTREGA CARPETAS E INSPÈCCION A.E. VIVIENDA		259
TRAMITES APROBACION DE PLANOS EN GENERAL		463
AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCION		119
ELABORACION DE PROYECTOS DE RELAMIENTOS MUNICIPALES		5
NOTIFICACIONES		524

INFORMES TECNICOS



NOTIFICACIONES



ACTIVIDAD	CANTIDAD
INFORMES TECNICOS VARIOS	117
INICIO DE TRAMITES DE SANEAMIENTO DE TERRENOS	14
ELABORACION DE PLANOS DE EQUIPAMIENTOS G.A.M.LL.	3
PERFILES DE PROYECTO	2
ENTREGA CARPETAS E INSPÈCCION A.E. VIVIENDA	259
TRAMITES APROBACION DE PLANOS EN GENERAL	463
AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCION	119
ELABORACION DE PROYECTOS DE RELAMIENTOS MUNICIPALES	5
NOTIFICACIONES	524

Al respecto cabe informar que cada una de estas actividades conlleva un proceso y procedimiento determinados, lo cual toma su tiempo, siendo que lo que se presenta es un resumen en tabla y numero es un reflejo de las funciones en general de la UN.O.T.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



GRACIAS POR SU ATENCION !!
